



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 14

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 08/11/2012

EXECUÇÃO:

No pavimento térreo, as instalações elétricas e hidráulicas encontram-se concluídas e a execução do reboco das áreas internas está em andamento.


Na fachada frontal do mesmo pavimento o reboco encontra-se concluído e na dos fundos, em andamento. A técnica empregada e a qualidade da execução estão dentro do padrão de bom acabamento.

O aterro das áreas internas do pavimento térreo está sendo assentado para que a execução do contra piso seja iniciada em uma etapa futura.

No pavimento superior, as paredes estão sendo preparadas, para o início da a execução das instalações hidráulicas e elétricas (rasgos sendo abertos).

As escoras ainda estão presentes no pavimento superior, e em aproximadamente em dezoito dias, após a cura total do concreto, serão retiradas.

Na cobertura, as telhas já foram colocadas, estando em andamento os acabamentos do retelho (cumeeira e calhas).

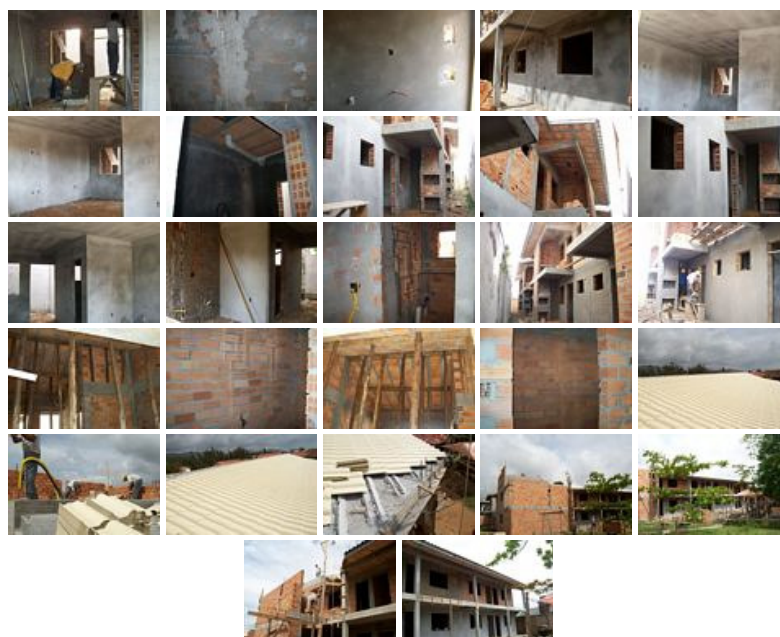

VOLTAR
