



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 32

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 11/04/2013

EXECUÇÃO:

A montagem da laje está sendo finalizada pela parte da manhã, a Tarde será executada a concretagem.
As ferragens das vigas da laje estão montadas, as caixas de luz de teto estão posicionadas conforme o projeto elétrico e fixadas para evitar deslocamentos indevidos.
As tubulações também já encontram-se distribuídas e fixadas na malha de ferro com presilhas plásticas evitando assim que se desloquem. O escoramento da laje já está finalizado.


As tubulações de passagem da fiação elétrica, churrasqueira e rede de esgoto já estão posicionadas na laje, evitando assim futura quebra com equipamentos de impacto.

Os rebaixos dos box de banho e das varandas de frente e fundos, já estão executadas conforme o projeto arquitetônico.

No período da tarde a concretagem ocorreu de maneira tranquila sem imprevistos.

Foi usado concreto usinado com Fck25 e a aplicação utilizando caminhão para bombeamento do concreto. Desta maneira a concretagem foi mais rápida e uniforme. A utilização de vibrador para "assentar" o concreto em toda a extensão da laje, garante uma estrutura mais uniforme e sem falhas.

A concretagem se deu dentro das técnicas adequadas e com ótimo padrão de qualidade.

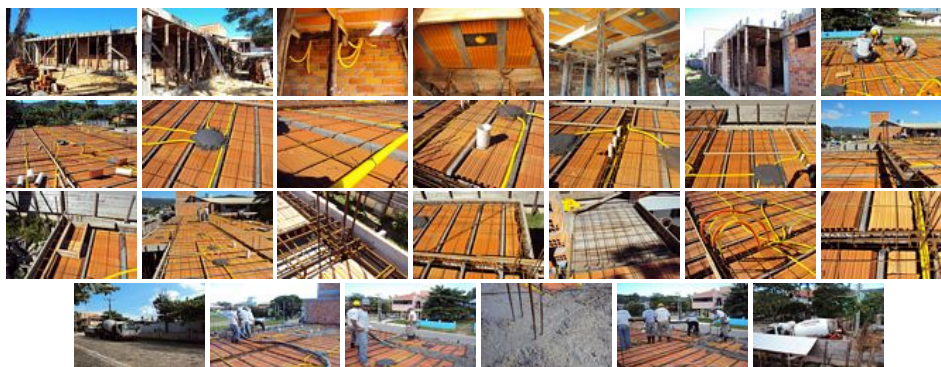

VOLTAR

*
