



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 25

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 31/01/2013

EXECUÇÃO:

A obra entra em sua reta final para a inauguração. Os últimos serviços de acabamento estão em execução.

No primeiro pavimento a parte interna dos apartamentos estão finalizadas e os móveis estão em montagem. Acabamentos de rejunte e pintura estão sendo feitos na parte externa da edificação.

As caixas de passagem da elétrica e águas pluviais estão executadas e a previsão é para no início da semana que vem a ligação do novo padrão de energia e ligação da nova entrada de energia elétrica.

A fossa e filtro já estão executados, conforme projeto e dentro das especificações técnicas adequadas.

A execução das valas de infiltração estão programadas para o início da semana que vem.


A parte dos fundos da edificação começa a receber a limpeza final.

No segundo pavimento o corrimão da circulação está em fase de finalização com um trabalho muito bom de marcenaria.

Junto acabamentos de pintura e rejunte de piso da circulação externa estão em execução.

A previsão é para a finalização da parte interna até o final sábado ficando apenas a parte externa para a próxima semana.

A qualidade da instalação dos serviços contratados e de execução da obra continua muito boa.

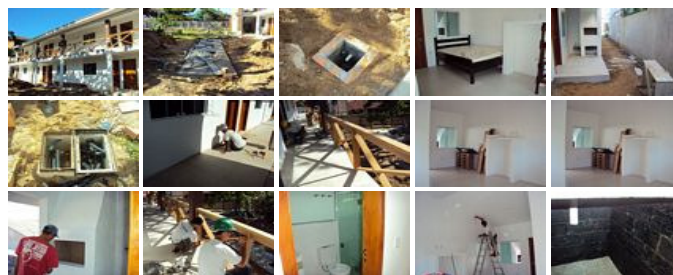

VOLTAR
